

令和元年台風第19号災害復旧事業について

資料No. 10- 1

都市整備部建設課

1. 布下橋、切久保橋、本下之城橋の進捗状況について

箇所	当初事業予算	事業費見込み (R3.11時点)	工種等	令和元年度					令和2年度												令和3年度												令和4年度									
				10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8				
布下橋災害復旧 (千曲川)	【委託料】 55,000,000 円	【委託料】 52,536,000 円	設計・測量・調査	査定設計					橋梁詳細設計、道路詳細設計																																	
	【工事費】 750,000,000 円	【工事費】 735,864,000 円	工事用道路 (株)竹花組東御支店						工事用道路			工事用道路																														
	【用地費】 12,000,000 円	【用地費】 9,600,000 円	旧橋撤去工 (株)竹花組東御支店											旧橋撤去工、仮設道路工							仮設復旧																					
	【補償費】 6,000,000 円	【補償費】 2,000,000 円	下部工 (株)守谷商会											橋台2基、橋脚1基、護岸工																												
	【事業予算】 823,000,000 円	【事業費】 800,000,000 円	上部工 (株)角藤 R2.12.8～R4.3.31											設計照査			工場製作工				鋼橋架設工					床版工			高欄等													
			取付道路工 (株)竹花組東御支店 R3.9.22～R4.3.31																										土工 水路工			舗装工 補装工										
切久保橋災害復旧 (鹿曲川)	【委託料】 35,000,000 円	【委託料】 23,683,000 円	設計・測量・調査	査定設計					橋梁詳細設計																																	
	【工事費】 350,000,000 円	【工事費】 309,317,000 円	工事用道路 (株)東建工業						工事用道路 旧橋撤去工																																	
	【補償費】 15,000,000 円	【補償費】 7,000,000 円	下部工 (株)竹花組東御支店 R2.9.15～R3.12.31											橋台2基、橋脚1基、護岸工							護岸工																					
	【事業予算】 400,000,000 円	【事業費】 340,000,000 円	上部工 (株)角藤 R3.4.30～R4.3.31														設計照査				工場製作工				架設工					床版工 高欄、舗装工												
			水道管 (佐久水道企業団)																					仮設復旧					水道添架													
本下之城橋災害復旧 (鹿曲川)	【委託料】 25,000,000 円	【委託料】 16,379,000 円	設計・測量・調査	査定設計					橋梁詳細設計																																	
	【工事費】 250,000,000 円	【工事費】 193,281,000 円	下部工 竹内工業(株)											橋台2基、護岸工																												
	【用地費】 4,200,000 円	【用地費】 340,000 円	上部工 トライアン(株) R3.4.30～R4.3.31														設計照査				工場製作工				架設工					床版工 高欄等												
	【事業予算】 279,200,000 円	【事業費】 210,000,000 円	取付道路工 竹内工業(株) R3.9.22～R4.3.31																					仮設復旧					土工 舗装工													
全体事業費 (R3.11時点)	全体事業費(当初) 1,502,200,000 円 補助金 970,000,000円 地方債 477,000,000円 その他 55,200,000円	全体事業費(実施) 1,350,000,000 円 補助金 1,137,000,000円 地方債 191,000,000円 その他 22,000,000円																																								


令和元年台風第19号災害復旧事業について

都市整備部建設課

【布下橋 進捗状況】



【切久保橋 進捗状況】

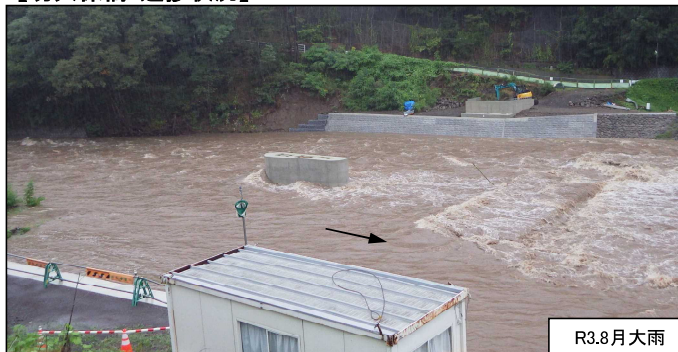


【本下之城橋 進捗状況】



令和元年台風第19号災害復旧事業について

1. 桜井川原耕地災害復旧事業の進捗状況について

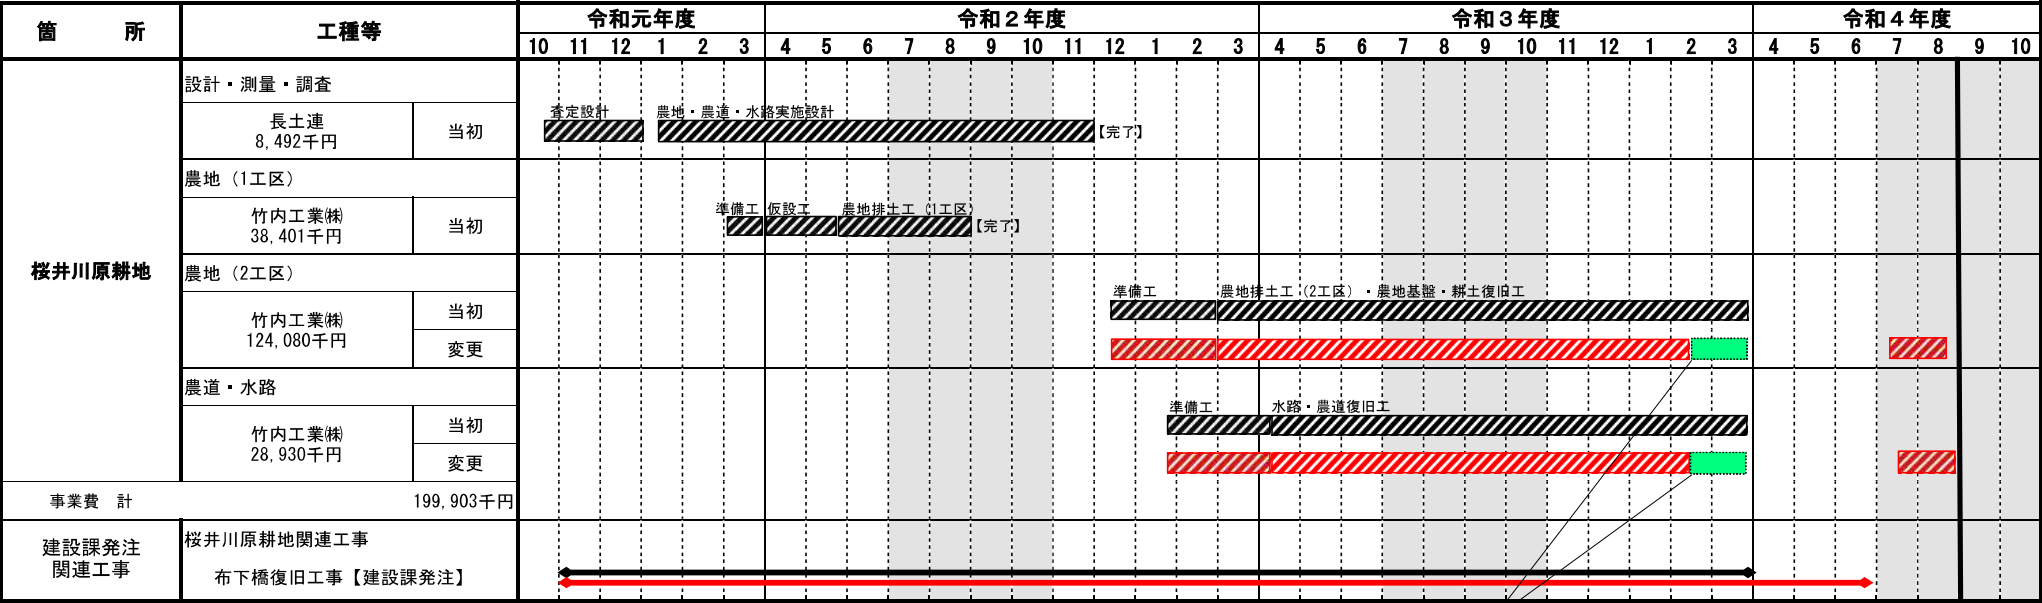

【工期延長理由】
桜井川原耕地の復旧箇所に、布下橋復旧工事用の仮設道路があり、4月以降も利用することから、布下橋復旧工事の工期延長に伴い桜井川原耕地の復旧工事についても工期を延長行い、8月末の農地復旧完了を目指します。

2. 台風19号豪雨災害復旧事業（国庫補助対象）の事業費について


R3.11月末時点契約額

工種別	全体				左記のうち未完成部分					
	契約 件数	事業費（千円）			契約 件数	工事費（千円）	内 訳（千円）		R4繰越予定額	
	委託料	工事費	計							
農地 補助率：97.4%	30	20,630	288,457	309,087	1	124,080	1	桜井外川原農地災害復旧工事 【竹内工業株式会社】	124,080	
農業用施設 補助率：99.8%	15	51,788	955,144	1,006,932	5	28,930	1	桜井外川原農業用施設災害復旧工事 【竹内工業株式会社】	道路 水路	28,930
						364,100	2	加沢新堰頭首工及び堤外水路災害 復旧工事 【竹花工業株式会社田中支店】	頭首工 水路	
						226,600	3	川原田頭首工災害復旧工事 【北澤土建株式会社東御支店】	頭首工	
						5,305	4	所沢川頭首工災害復旧工事（1工区） （一部出来形払い有） 【東部開発株式会社】	頭首工	
						21,615	5	鹿曲川頭首工災害復旧工事 【竹内工業株式会社】	頭首工	
計	45	72,418	1,243,601	1,316,019	6	770,630	未完成 計6箇所		153,010	



復旧状況説明図

標準横断面図

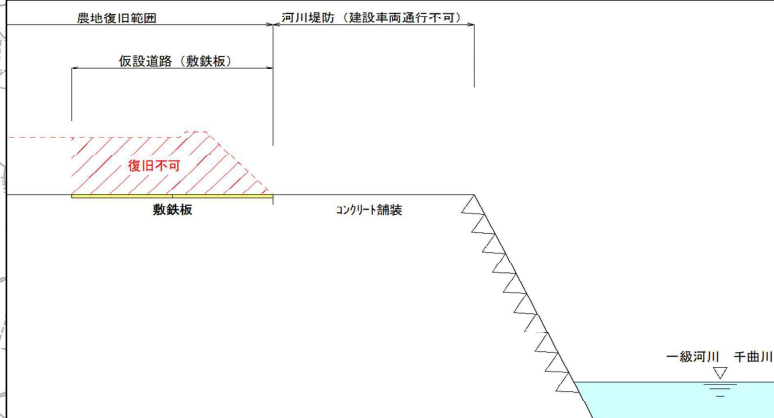


現場写真



凡 例

	頭首工復旧完了に伴う耕作可能農地
	災害復旧完了に伴う耕作可能農地
	災害復旧中農地（一部畑は耕作可能）

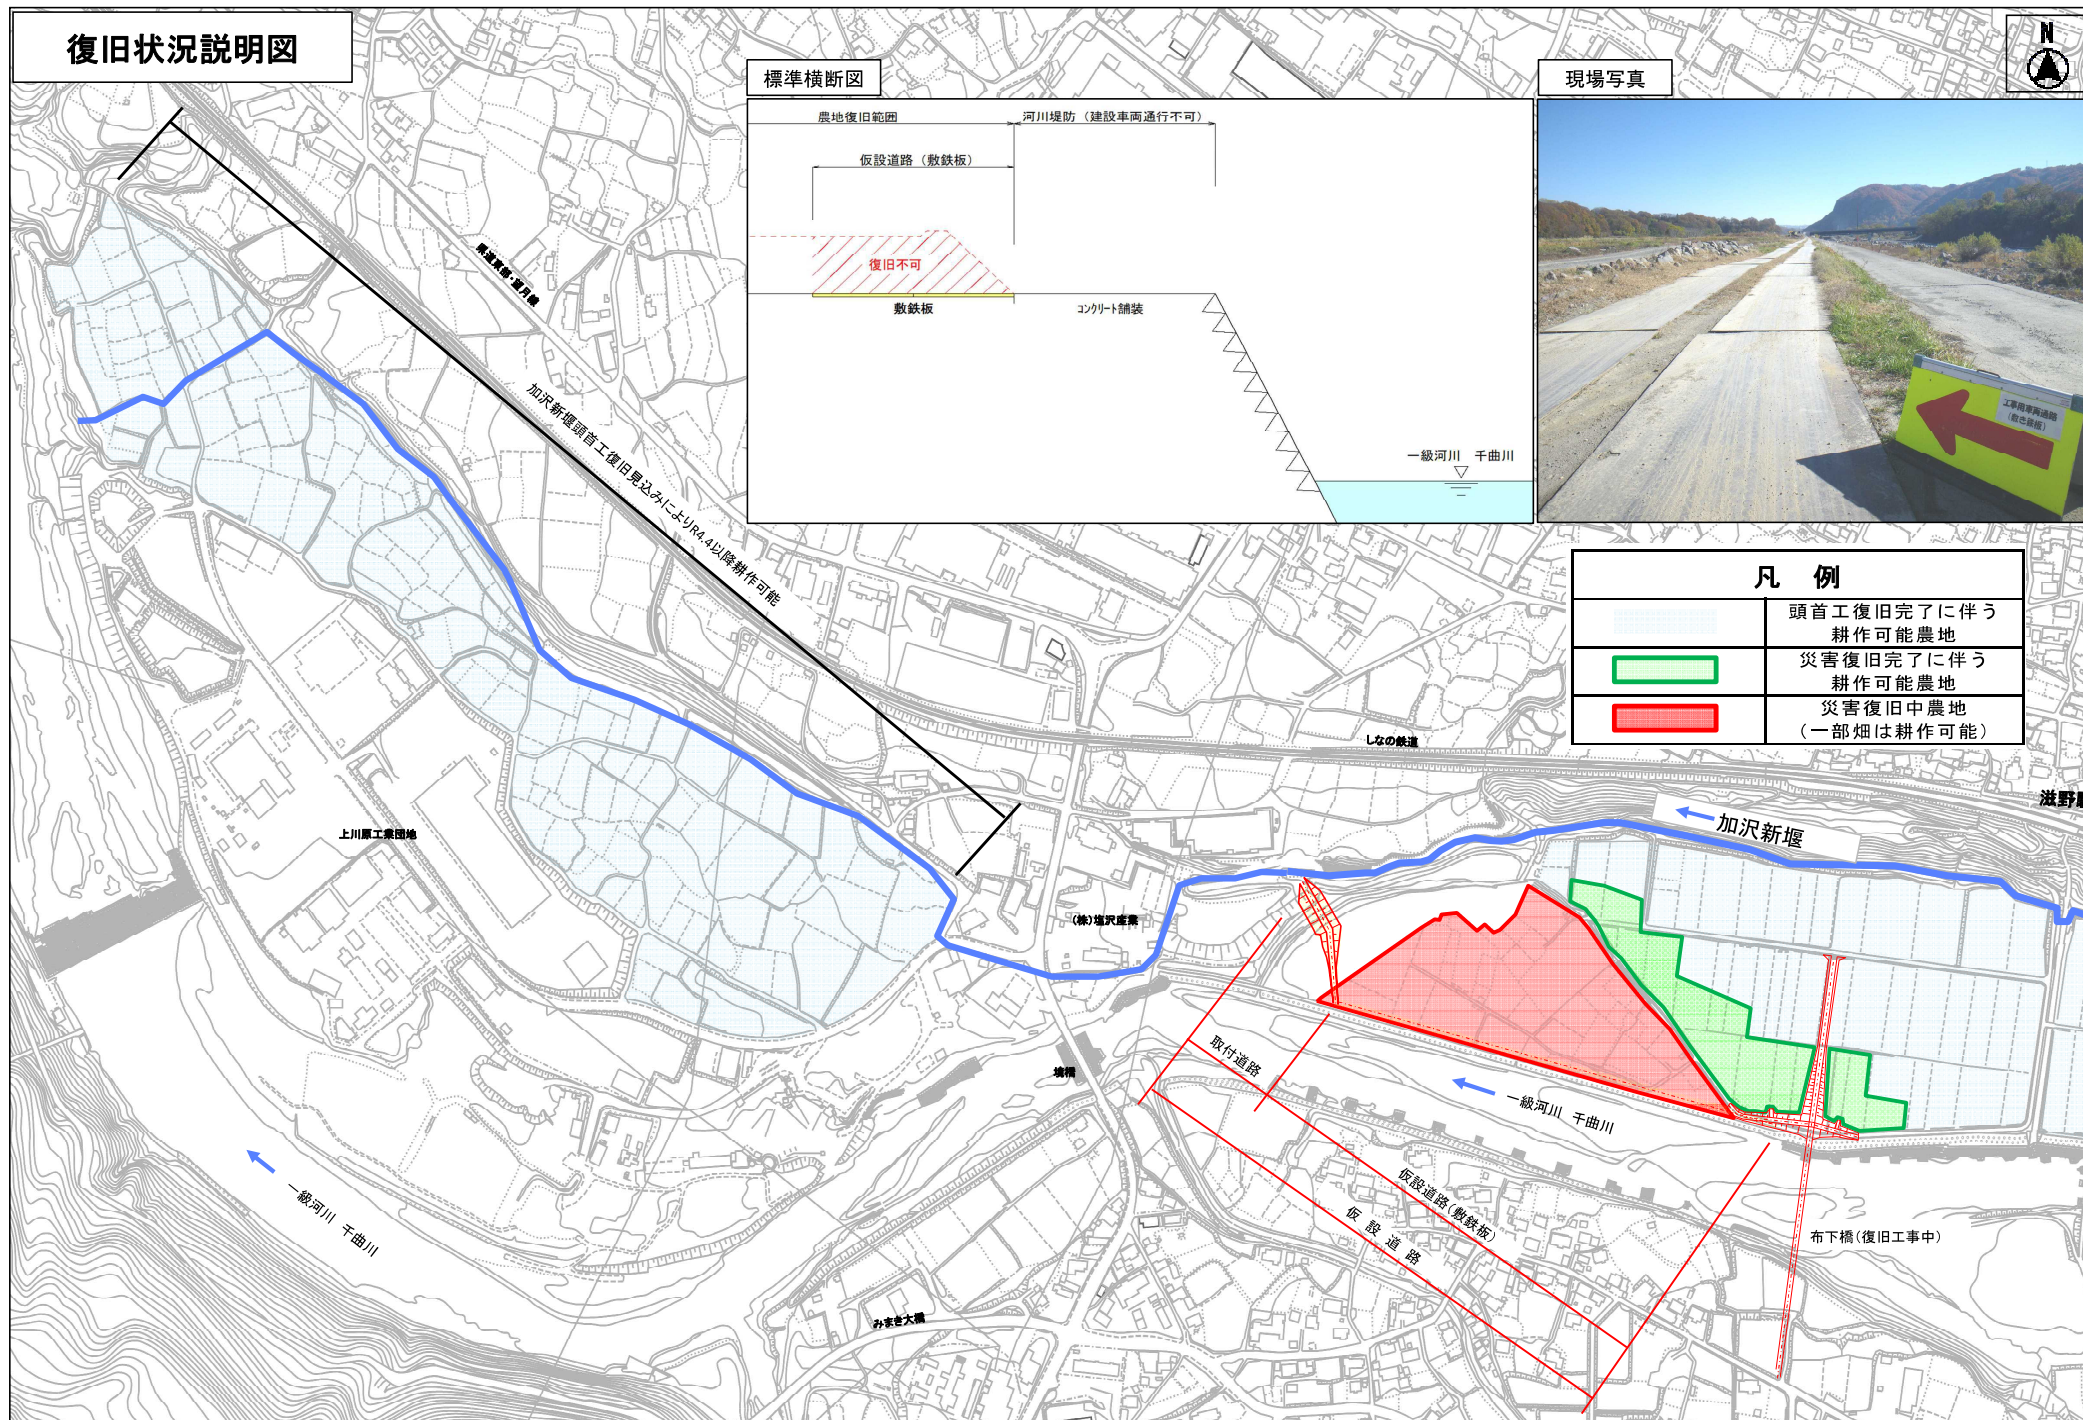

縮尺 1 : 5000
